


Separatkloakering Fayesgade m.fl.
Mariagerfjord vand A/S
Gunnar Nielsen A/S

Id	Opgavetil	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Gantt chart timeline															
						08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07		
1		Separatkloakering af Fayesgade m.fl.																			
2		Dato: 03-06-2020																			
3		Færdiggørelse af ledninger i Skovvej																			
4																					
5		Kloakarbejder	69 dage?	ti 09-06-20	fr 11-09-20																
6																					
7		Etablering af sugespidsanlæg	3 dage	to 18-06-20	ma 22-06-20																
8																					
9		Kloakhold 1																			
10		A11S060 - A11S070 34,4m	20 dage	ma 29-06-20	fr 24-07-20																
11		A11S070 - A11S080 31m	10 dage	ma 27-07-20	fr 07-08-20																
12		A11S080 - A12S110 25m	10 dage	ma 10-08-20	fr 21-08-20																
13																					
14		Kloakhold 2																			
15		A11R060 - A11F065 3,5m	10 dage	ma 13-07-20	fr 24-07-20																
16		A11S060 - A11S060-T 6,2m	5 dage	ma 27-07-20	fr 31-07-20																
17		A12S108 - A11F405 2,9m	5 dage	ma 17-08-20	fr 21-08-20																
18																					
19		Asfaltering																			
20		Skovvej	15 dage	ma 24-08-20	fr 11-09-20																
21																					
22		Fjernvarme/vand	69 dage	ti 09-06-20	fr 11-09-20																
23																					
24		Blåkildevej	14 dage	ti 09-06-20	fr 26-06-20																
25																					
26		Særligt farlige arbejder	69 dage	ti 09-06-20	fr 11-09-20																

Projekt Tidsplan	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		Kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			

Separatkloakering Fayesgade m.f.l. Mariagerfjord vand A/S Gunnar Nielsen A/S

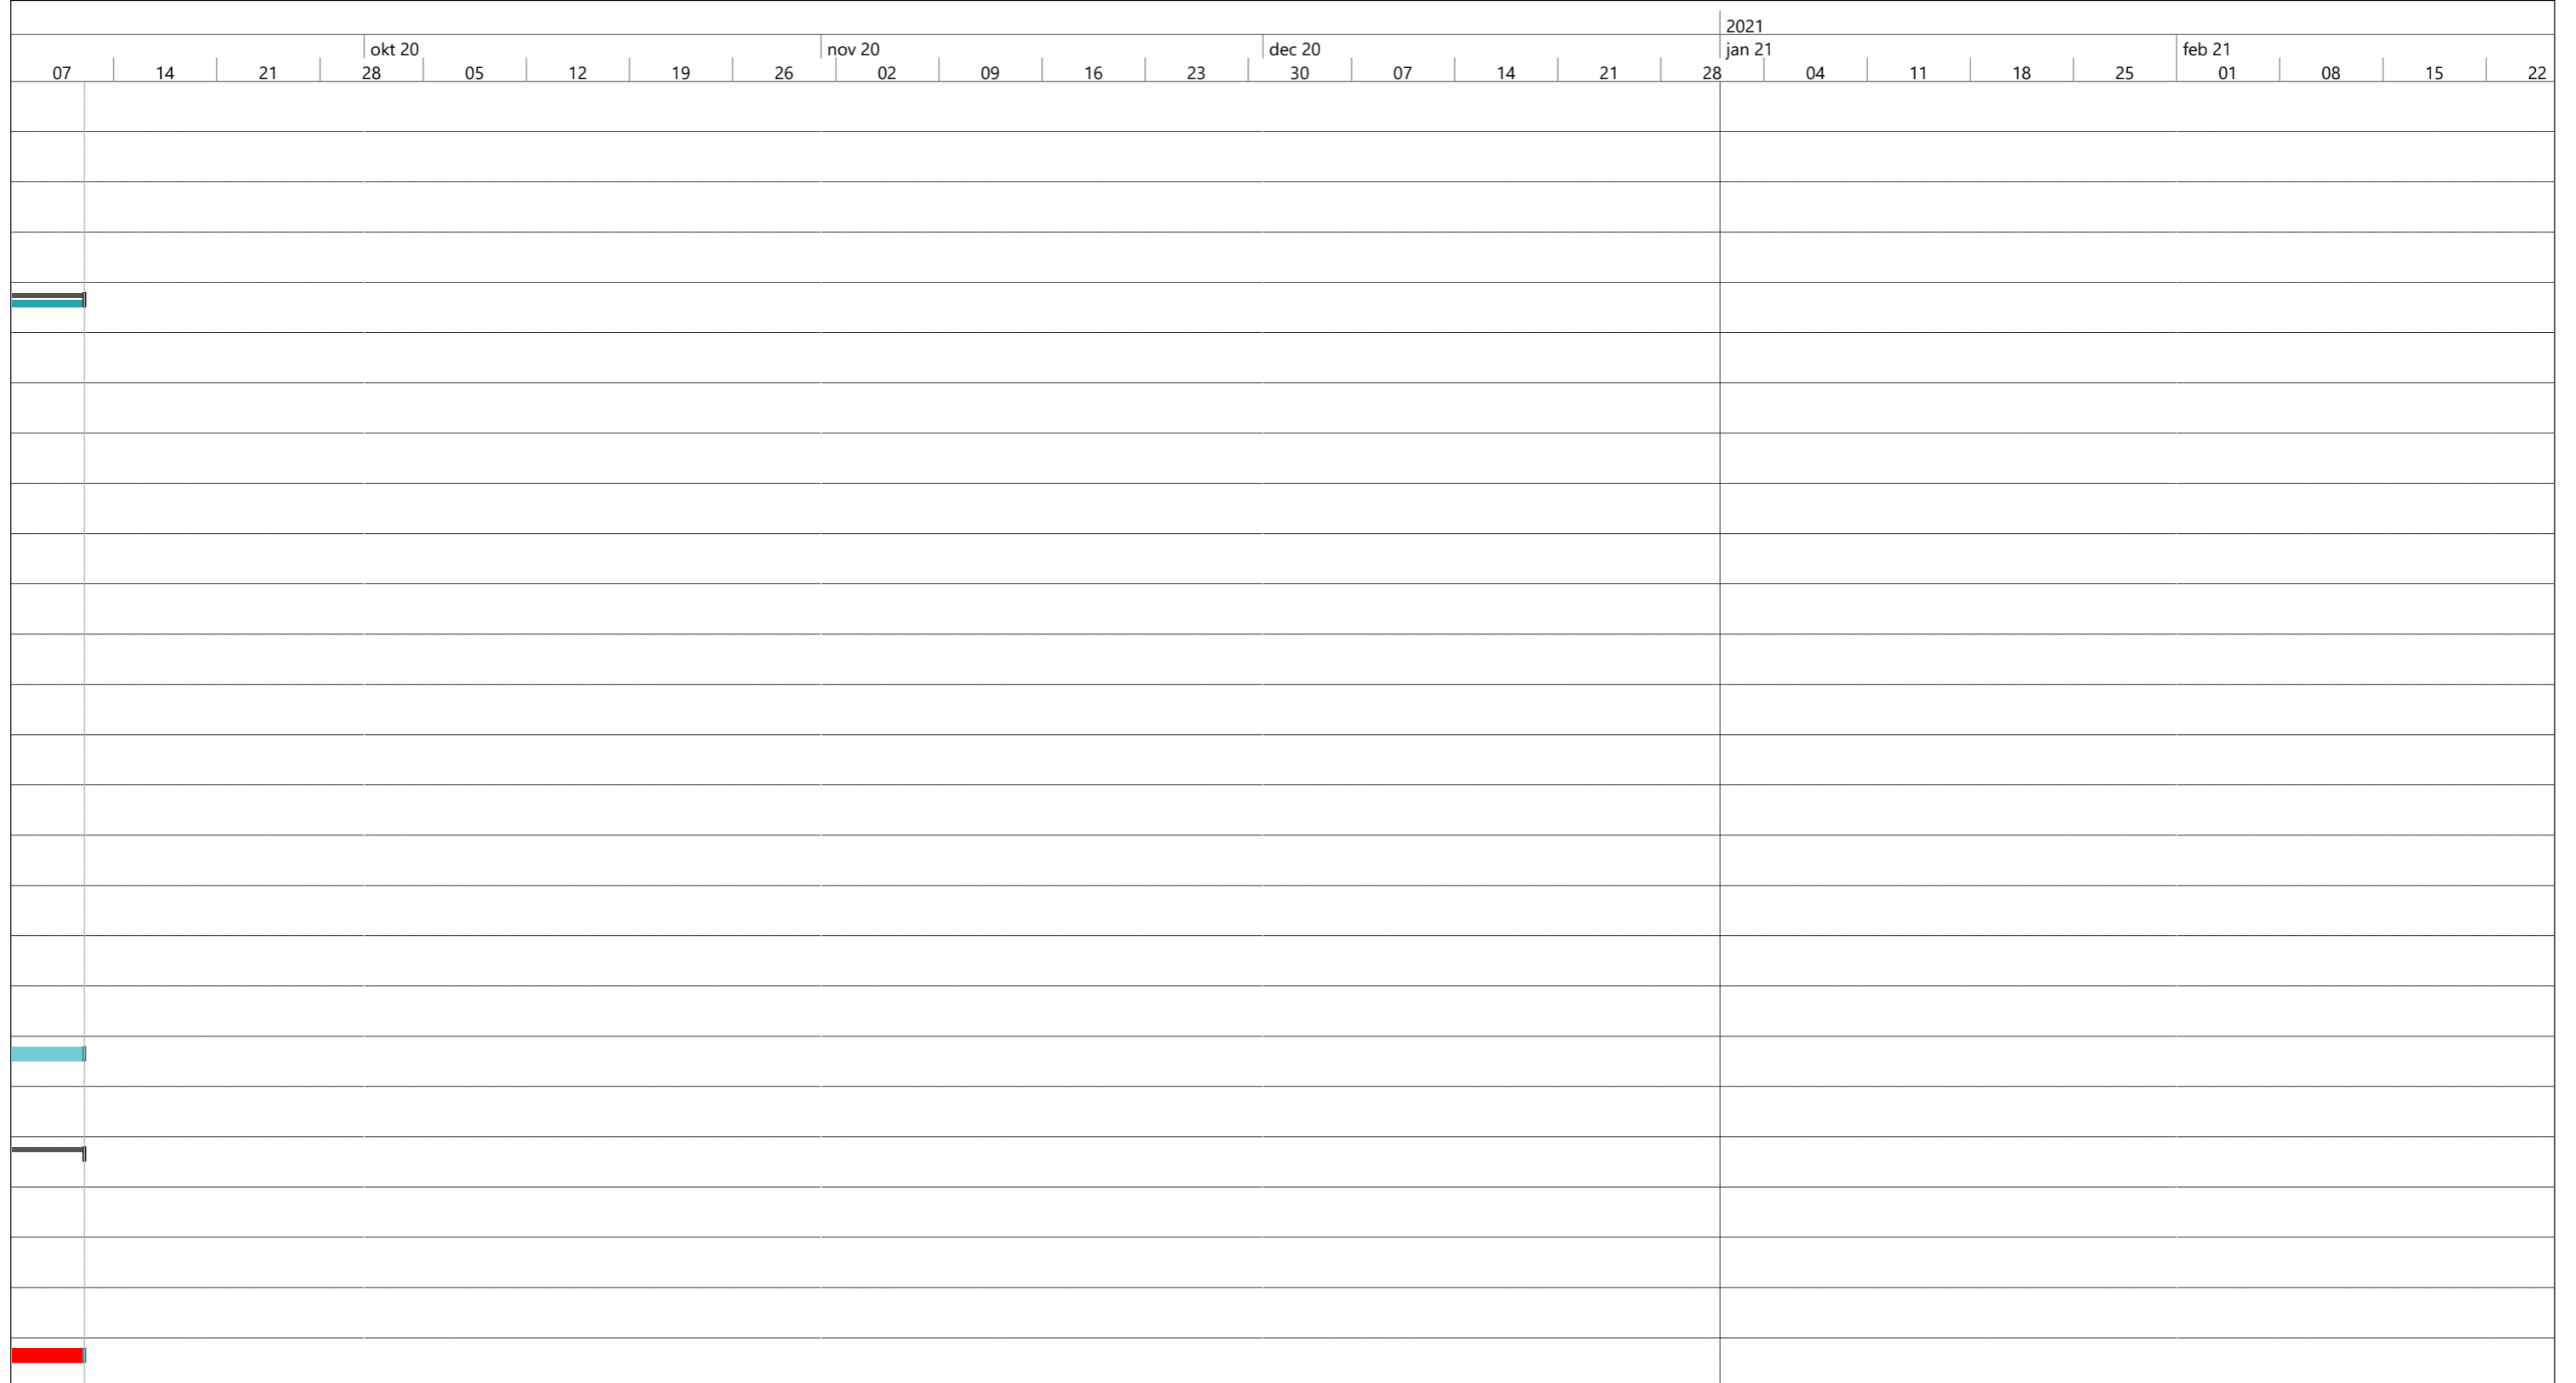

Projekt Tidsplan	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		Kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			
