Sommerhuskloakering i Øster Hurup, etape 4 Ledningsarbejder
Hovedtidsplan Delområde 2 2019

Dato: 12-02-2019
Revision: 00
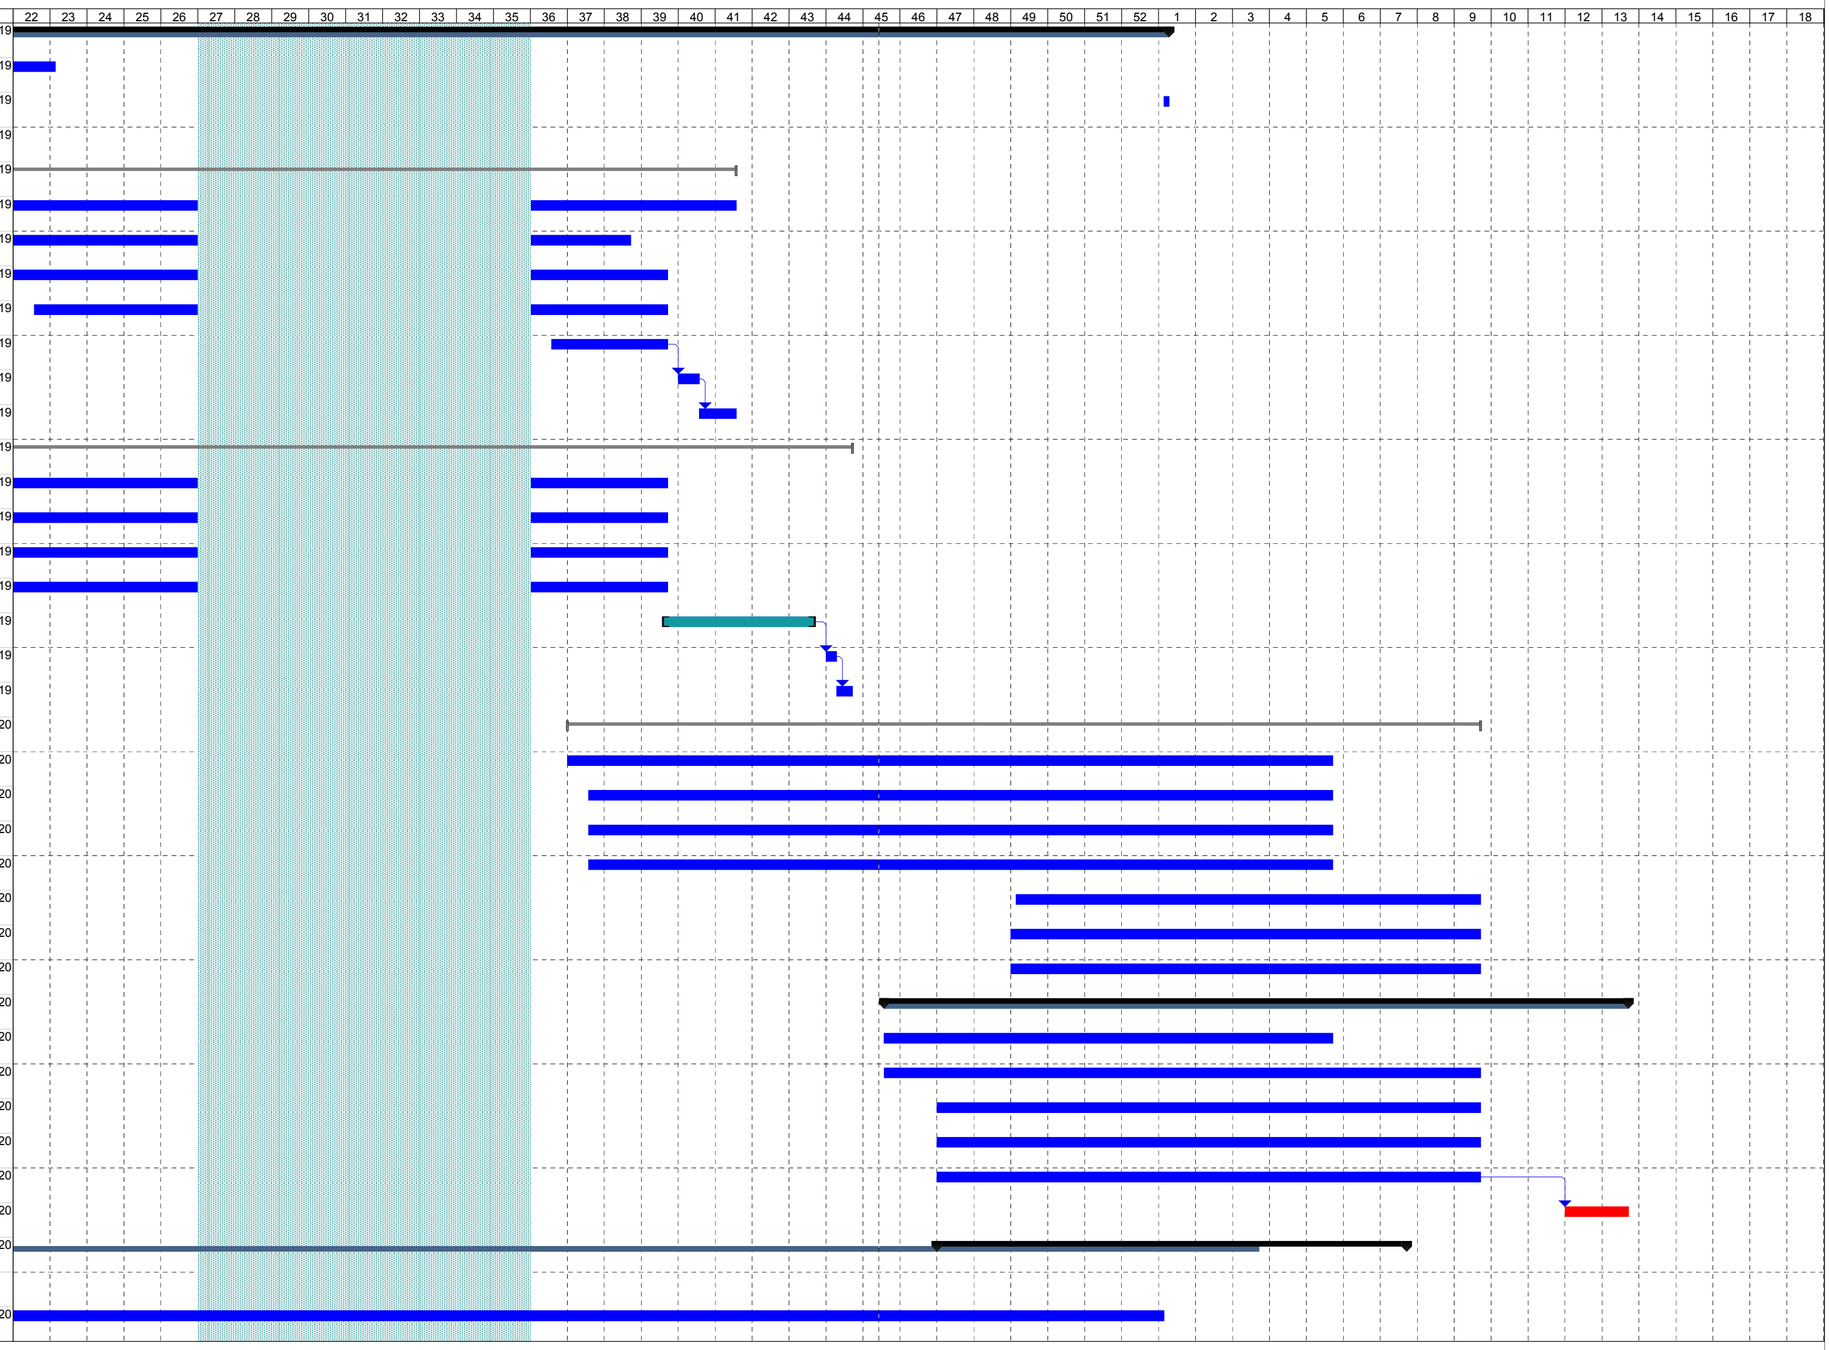
Id	Aktiviteter	mængde	Varighed	Startdato	Slutdato
1	**Milestones**		137 dage?	ma 22-04-19	ti 31-12-19
2	Opstart område 2		21 dage?	ma 06-05-19	ma 03-06-19
3	Færdiggørelse område 2		1 dag?	ti 31-12-19	ti 31-12-19
4	Opstart delområde 2 iht. udbud		1 dag?	ma 22-04-19	ma 22-04-19
5	**Toften 1-61**		69 dage	ma 06-05-19	to 10-10-19
6	Vakuumbrønde	22 stk	69 dage	ma 06-05-19	to 10-10-19
7	Samlebrønde	8 stk	55 dage	ma 06-05-19	fr 20-09-19
8	Skelbrønde	61 stk	53 dage	on 15-05-19	fr 27-09-19
9	Stikledninger	600 lbm	41 dage	fr 31-05-19	fr 27-09-19
10	Vakuumledninger Ø63-Ø125	1000 lbm	16 dage	fr 06-09-19	fr 27-09-19
11	Styrekabel	1000 lbm	4 dage	ma 30-09-19	to 03-10-19
12	Retablering belægning		5 dage	fr 04-10-19	to 10-10-19
13	**Bakkerne 1-41**		75 dage	ma 20-05-19	fr 01-11-19
14	Vakuumbrønde	14 stk	50 dage	ma 20-05-19	fr 27-09-19
15	Samlebrønde	7 stk	50 dage	ma 20-05-19	fr 27-09-19
16	Skelbrønde	43 stk	50 dage	ma 20-05-19	fr 27-09-19
17	Stikledninger	430 m	50 dage	ma 20-05-19	fr 27-09-19
18	Vakuumledninger Ø90-Ø160	560 m	21 dage	fr 27-09-19	fr 25-10-19
19	Styrekabel	560 m	2 dage	ma 28-10-19	ti 29-10-19
20	Retablering belægning		3 dage	on 30-10-19	fr 01-11-19
21	**Stenkisten 4-130**		125 dage	ma 09-09-19	fr 28-02-20
22	Vakuumbrønde	38 stk	105 dage	ma 09-09-19	fr 31-01-20
23	Samlebrønde	10 stk	101 dage	fr 13-09-19	fr 31-01-20
24	Skelbrønde	99 stk	101 dage	fr 13-09-19	fr 31-01-20
25	Stikledninger	1000 m	101 dage	fr 13-09-19	fr 31-01-20
26	Vakuumledninger Ø90-Ø160	1200 m	64 dage	ti 03-12-19	fr 28-02-20
27	Styrekabel	1200 m	65 dage	ma 02-12-19	fr 28-02-20
28	Retablering belægning		65 dage	ma 02-12-19	fr 28-02-20
29	**Brøndbækken 1- 57**		101 dage	fr 08-11-19	fr 27-03-20
30	Vakuumbrønde	17	61 dage	fr 08-11-19	fr 31-01-20
31	Skelbrønde	52	81 dage	fr 08-11-19	fr 28-02-20
32	Stikledninger	500	75 dage	ma 18-11-19	fr 28-02-20
33	Vakuumledninger Ø90-Ø160	800	75 dage	ma 18-11-19	fr 28-02-20
34	Styrekabel	800	75 dage	ma 18-11-19	fr 28-02-20
35	Retablering belægning		10 dage	ma 16-03-20	fr 27-03-20
36	**Diverse**		65 dage?	ma 18-11-19	fr 14-02-20
37					
38	Særligt farlig arbejde		140 dage?	ma 06-05-19	fr 17-01-20
