Separatkloakering Fayesgade m.f.l.
Mariagerfjord vand A/S
Gunnar Nielsen A/S

Id	Opgavetil:	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Foregående opgaver
1		**Separatkloakering af Fayesgade m.fl.**				
2		Dato: 20-03-2020				
3		Indretning af byggeplads	7 dage	ma 26-08-19	ti 03-09-19	
4						
5						
6		**Kloakarbejder**	**191 dage**	**ma 02-09-19**	**ma 25-05-20**	
7						
8		**Kloakhold 1**				
9		Underboringer	5 dage	ma 23-09-19	fr 27-09-19	
10		Strømpeforing	3 dage	on 25-09-19	fr 27-09-19	
11		Kloak Gasværksvej - skibsbakken	14 dage	ti 29-10-19	fr 15-11-19	10
12		Skibsbakken	25 dage	ma 18-11-19	fr 20-12-19	11
13		Fayesgade/Skovvej	70 dage	ma 20-01-20	fr 24-04-20	
14		Blåkildevej (underboring)	10 dage	ma 27-04-20	fr 08-05-20	13
15		**Kloakhold 2**				
16		Etabnlering af Københavnervæg	3 dage	on 23-10-19	fr 25-10-19	
17		Beltoftsgade	15 dage	ma 18-11-19	fr 06-12-19	
18		Wedelsgade	7 dage	ma 09-12-19	ti 17-12-19	
19		Omkobling Markedsgade	7 dage	ti 04-02-20	on 12-02-20	
20		Ny RV tilkobles AF11065	7 dage	ma 10-02-20	ti 18-02-20	
21		Skovvej 20 - 29	15 dage	ti 10-03-20	sø 29-03-20	
22		RV A20R965 - A11R060	14 dage	ma 30-03-20	to 16-04-20	
23		**Asfaltering**				
24		Beltoftsgade/Wedelsgade/Skibsbakken/Fayesgade 3 - 21	4 dage	to 19-03-20	ti 24-03-20	
25		Asfaltering Skovvej	3 dage	on 06-05-20	fr 08-05-20	
26		Blåkildevej	2 dage	fr 22-05-20	ma 25-05-20	
27						
28		**Fjernvarme/vand**	**189 dage?**	**on 04-09-19**	**ma 25-05-20**	
29						
30		Fayesgade/Skovvej	40 dage?	on 04-09-19	ti 29-10-19	
31		Wedelsgade	5 dage	to 21-11-19	on 27-11-19	30
32		Beltoftsgade	8 dage	ma 11-11-19	on 20-11-19	
33		Skibsbakken	27 dage	ma 06-01-20	ti 11-02-20	
34		Skovvej	14 dage	to 28-11-19	ti 17-12-19	
35		Montanavej	14 dage	ti 11-02-20	fr 28-02-20	
36		Blåkildevej	14 dage	ti 05-05-20	fr 22-05-20	
37						
38		**Særligt farlige arbejder**	189 dage	on 04-09-19	ma 25-05-20	

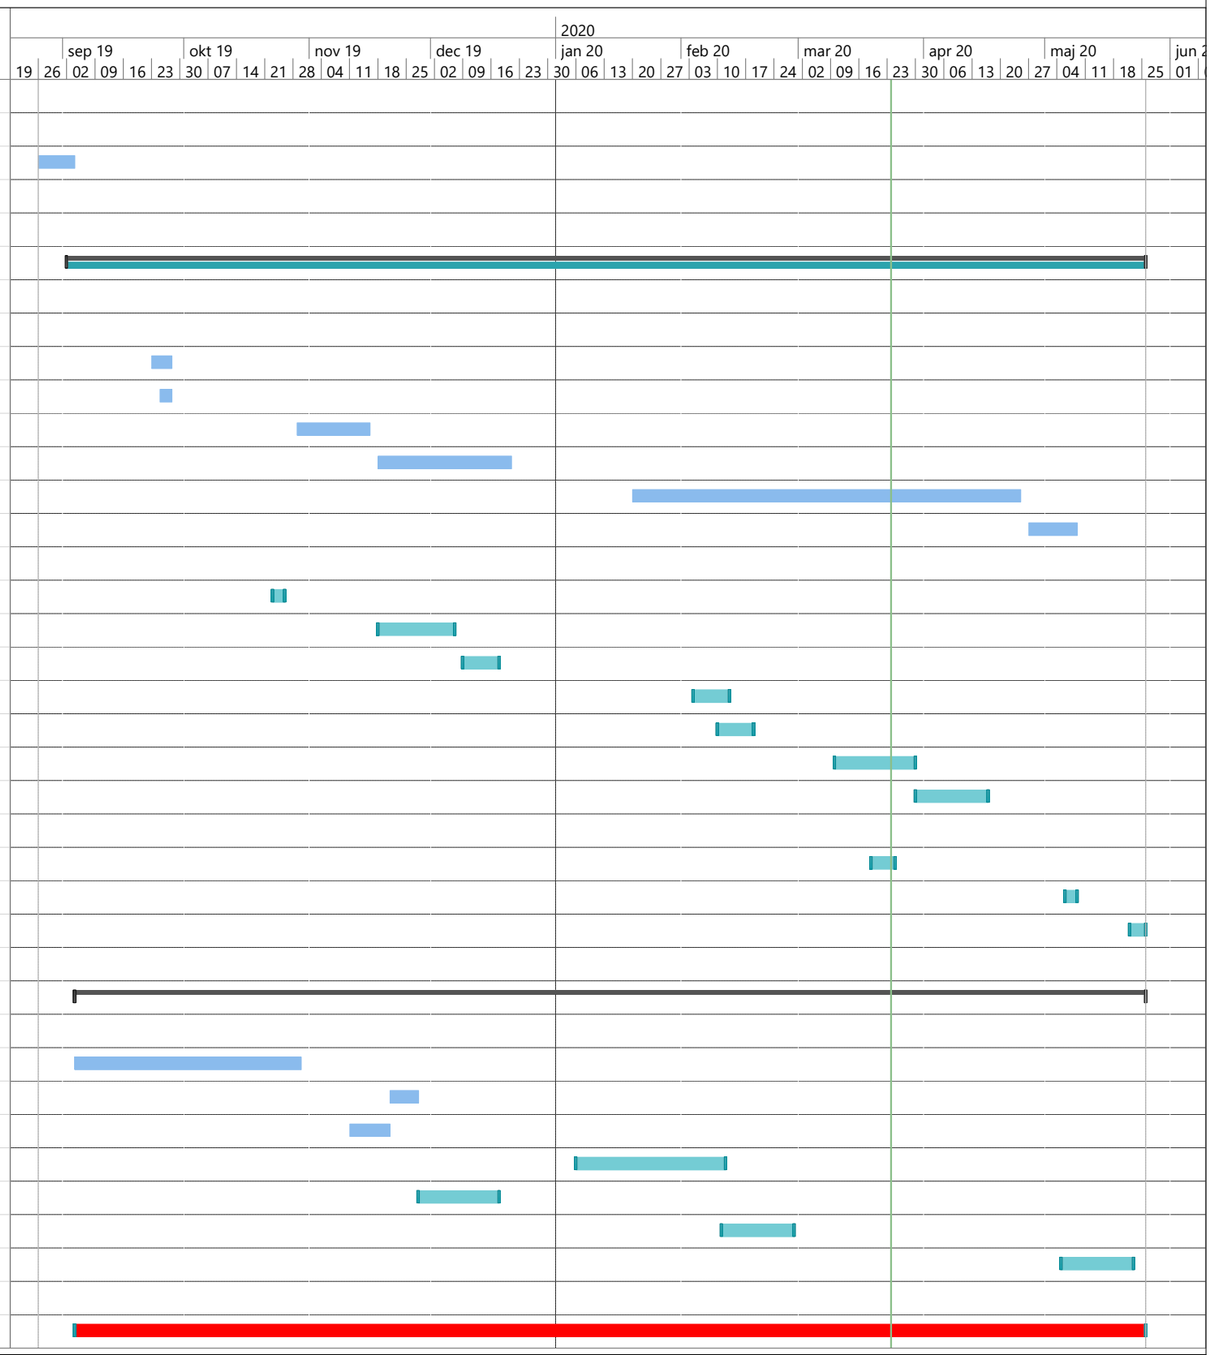

Projekt Tidsplan

Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		Kun start		Deadline	
Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			
